

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TEOTONGO, MUNICIPIO DE TEOTONGO, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:30 HRS. DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. OSCAR RIVERA PEREZ Y MARIA ARACELI BETANZOS RIVERA EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EL SALADO", CON NUMERO DE CONTRATO: COP/MT/547/R33/FAISMUN/003/2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

UBICACIÓN :

ESTADO : OAXACA
REGIÓN : MIXTECA
DISTRITO : TEPOSOLCULA
MUNICIPIO : TEOTONGO
LOCALIDAD : TEOTONGO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GENERAL 33
RAMO: FONDO III DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO: OF. A/MT/547/R33/FAISMUN/003/2024
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DE 2024
DE FECHA: SE EJECUTARON LAS PARTIDAS DE: PRTRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, SUMINISTRO, Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, CARRETILLA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESCENSO Y ELEVACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA -25.00 METROS DE LOS MATERIALES SEGÚN EL CONCEPTO QUE LO REQUIERA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: ANDAMIOS, CARRETILLA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESCENSO Y ELEVACIÓN A UNA ALTURA DE HASTA -10.00 METROS DE LOS MATERIALES SEGÚN EL CONCEPTO QUE LO REQUIERA, DESASOLVE DE POZO A MANO EN TERRENO DE MATERIAL TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA A UNA PROFUNDIDAD DE 3.90 MTS A 15.00 METROS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" Y 8HP, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO DE F'c= 250 KG/CM2, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESASOLVE A BANCO INDICADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, DISTANCIA MAXIMA DE TIRO DE 1 KM DEL PUNTO DE LA OBRA, CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10X14X28 CM., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO A BASE DE GALVATEJA COLOR ROJO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO.FO. DE 2" X 2" Ø, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 1" DE Ø DE FIERRO FUNDIDO MARCA VAMEX O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE 20.00 KG/CM2 DE 1/2" Ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE GASTO TIPO PROPELA DE 2" Ø, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE LARGO DE FOFO BRIDADA DE 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE FOFO BRIDADA DE 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 2" (DE 3.5 A 12.6 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 90° X 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 45° X 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 203 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE FOGO DE 2" X 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE FOGO DE 2" X 1", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA ROSCADA DE FOFO DE 2". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO L-200 DE 2" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE DADO DE 20X30X100 CMS DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM DE PARA FIJAR PIEZAS DEL MULTIPLE DE DESCARGA, EQUIPAMIENTO DE POZO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA ALTAMIRA DE 3" KOR6 R100-8, CON MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 10 HP TRIFASICO 60/230 VOLTS, DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENERWELL PARA 7.5-12.5 HP DE 23-32 A, TUBO TERMOCONTRACTIL CALIBRE 8, CONECTORES, MANIOBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 8. PARA ALIMENTACION DE BOMBA, LINEA DE CONDUCCION A BASE DE 2 TRAMOS DE TUBO DE FOGO DE 2", Y ALIMENTADORES ELECTRICOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
M.pio. Teotongo,
Dpto. Teposcolula,
Oax.
10-08-24 / 31-12-25

SINDICA MUNICIPAL
M.pio. Teotongo,
Dpto. Teposcolula,
Oax.
10-08-24 / 31-12-25

SUBCLASIFICACION: AGUA POTABLE MODALIDAD: MANTENIMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
CONTRATO No.: COP/MT/547/R33/FAISMUN/003/2024 DE FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FECHA DE CONCLUSIÓN REAL: 02 DE NOVIEMBRE DE 2024
METAS ALCANZADAS: 1.00 POZO BENEFICIARIOS: 550 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
RAMO 33 FONDO III	\$ 957,863.63	\$ 957,863.63	\$ 0.00	
RAMO 33 FONDO IV				
RAMO 28				
APORTACIÓN ESTATAL				
BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$ 957,863.63	\$ 957,863.63	\$ 0.00	

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Presidencia Municipal, Independencia 1, Centro, Teotongo, Oaxaca
Tel-Fax. (953)522 9072; Correo-e: santiagoteotongo06@gmail.com



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE:
CARGO:
R.F.C. :
IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:



OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE S. DE R.L. DE C.V.


C. ANDRES MATIAS ANAYA

GERENTE GENERAL

OPS221014E96

0478048544983

SEGUNDA PRIVADA DE HUERTO LAS FLORES NUMERO 111, FRACCIONAMIENTO TRINIDAD DE LAS HUERTAS, C.P. 68120, OAXACA DE JUAREZ OAXACA.



C. ANDRES MATIAS ANAYA

GERENTE GENERAL

OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE S. DE R.L. DE C.V.

RECIBEN LA OBRA:



SINDICATURA
MUNICIPAL


Mpio. Teotongo,
Dtto. Teposcolula,
Oax.

10-08-24 / 31-12-25

C. MARIA ARACELI BETANZOS RIVERA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Teotongo,
Dtto. Teposcolula,
Oax.
10-08-24 / 31-12-25

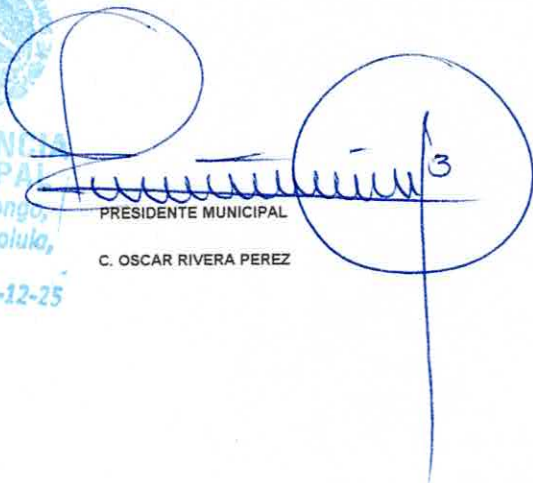

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OSCAR RIVERA PEREZ
